



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seruni No 66 Telp. (0285) 421600 - 51122 - Pekalongan

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN

LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
LOKASI : KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

Bulan Ke : I (SATU)
Periode Tanggal : 26 Maret 2025 s/d 20 April 2025

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	PEKERJAAN TEREALISASI	
				JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	927.000,00	1,40	927.000,00	1,40
II	PEKERJAAN TANAH	4.167.076,60	6,28	4.167.076,60	6,28
III	PEKERJAAN PASANGAN	6.381.606,39	9,61	6.381.606,39	9,61
IV	PEKERJAAN BETON	31.268.460,63	47,10	31.268.460,63	47,10
V	PEKERJAAN ATAP	22.790.108,14	34,33	22.790.108,14	34,33
VI	PEKERJAAN LISTRIK	847.067,82	1,28	847.067,82	1,28
	JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI	66.381.319,57	100,00	66.381.319,57	100,00
	PPN 11%	7.301.945,15		7.301.945,15	
	JUMLAH KESELURUHAN	73.683.264,73		73.683.264,73	
	JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN	73.683.000,00		73.683.000,00	

RENCANA PEKERJAAN S/D BULAN INI	99,30 %
REALISASI PEKERJAAN S/D BULAN INI	100,00 %
DEVIASI ----->	MENDAHULUI RENCANA 0,70 %

Pekalongan, 20 April 2025

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. BINA REKATAMA

NOVI LIYANA, S.Pd.
Direktur

Mengetahui:
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPKom)

M. ROFIKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

NI'MATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
 LOKASI : KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN : 2025

Bulan Ke : I (SATU)
 Periode Tanggal : 26 Maret 2025 s/d 20 April 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA			BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pek. Uitzet / Pengukuran	1,00	set	320.000,00	320.000,00	0,48	-	-	-	1,00	320.000,00	0,48	1,00	320.000,00	0,48
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	1,00	set	140.000,00	140.000,00	0,21	-	-	-	1,00	140.000,00	0,21	1,00	140.000,00	0,21
3	Pek. K3	1,00	set	280.000,00	280.000,00	0,42	-	-	-	1,00	280.000,00	0,42	1,00	280.000,00	0,42
4	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00	set	187.000,00	187.000,00	0,28	-	-	-	1,00	187.000,00	0,28	1,00	187.000,00	0,28
	Sub Total				927.000,00	1,40		-	-		927.000,00	1,40		927.000,00	1,40
II	PEKERJAAN TANAH														
1	Pek. Galian Tanah Biasa	11,64	m3	100.993,00	1.175.558,52	1,77	-	-	-	11,64	1.175.558,52	1,77	11,64	1.175.558,52	1,77
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	5,43	m3	67.275,00	365.303,25	0,55	-	-	-	5,43	365.303,25	0,55	5,43	365.303,25	0,55
3	Pek. Urugan Pasir	0,65	m3	313.053,00	203.484,45	0,31	-	-	-	0,65	203.484,45	0,31	0,65	203.484,45	0,31
4	Pek. Urugan Sirtu	10,27	m3	235.903,64	2.422.730,38	3,65	-	-	-	10,27	2.422.730,38	3,65	10,27	2.422.730,38	3,65
	Sub Total				4.167.076,60	6,28		-	-		4.167.076,60	6,28		4.167.076,60	6,28
III	PEKERJAAN PASANGAN														
1	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah (camp. 1Pc : 6Ps muntilan)	3,44	m3	1.138.412,60	3.916.139,34	5,90	-	-	-	3,44	3.916.139,34	5,90	3,44	3.916.139,34	5,90
2	Pek. Pas. Anstamping	1,30	m3	679.139,63	882.881,52	1,33	-	-	-	1,30	882.881,52	1,33	1,30	882.881,52	1,33
3	Pek. Acian Kolom dan Balok	33,38	m2	47.411,19	1.582.585,52	2,38	-	-	-	33,38	1.582.585,52	2,38	33,38	1.582.585,52	2,38
	Sub Total				6.381.606,39	9,61		-	-		6.381.606,39	9,61		6.381.606,39	9,61
IV	PEKERJAAN BETON														
1	Pek. Pondasi Footplat (70x70) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,78	m3	1.424.350,20	1.110.993,16	1,67	-	-	-	0,78	1.110.993,16	1,67	0,78	1.110.993,16	1,67
	b. Tulangan	136,36	kg	14.822,86	2.021.245,19	3,04	-	-	-	136,36	2.021.245,19	3,04	136,36	2.021.245,19	3,04
	c. Bekisting	4,48	m2	165.576,38	741.782,18	1,12	-	-	-	4,48	741.782,18	1,12	4,48	741.782,18	1,12
2	Pek. Sloof (12x18) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,65	m3	1.424.350,20	925.827,63	1,39	-	-	-	0,65	925.827,63	1,39	0,65	925.827,63	1,39
	b. Tulangan	154,83	kg	14.822,86	2.295.023,41	3,46	-	-	-	154,83	2.295.023,41	3,46	154,83	2.295.023,41	3,46
	c. Bekisting	10,80	m2	171.257,38	1.849.579,70	2,79	-	-	-	10,80	1.849.579,70	2,79	10,80	1.849.579,70	2,79
3	Pek. Kolom K1 (20x20) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	1,40	m3	1.424.350,20	1.994.090,28	3,00	-	-	-	1,40	1.994.090,28	3,00	1,40	1.994.090,28	3,00
	b. Tulangan	201,29	kg	14.822,86	2.983.693,49	4,49	-	-	-	201,29	2.983.693,49	4,49	201,29	2.983.693,49	4,49
	c. Bekisting	27,14	m2	191.598,71	5.199.988,99	7,83	-	-	-	27,14	5.199.988,99	7,83	27,14	5.199.988,99	7,83
4	Pek. Balok (15x25) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,63	m3	1.424.350,20	897.340,63	1,35	-	-	-	0,63	897.340,63	1,35	0,63	897.340,63	1,35
	b. Tulangan	129,16	kg	14.822,86	1.914.520,60	2,88	-	-	-	129,16	1.914.520,60	2,88	129,16	1.914.520,60	2,88
	c. Bekisting	10,91	m2	194.240,38	2.119.162,55	3,19	-	-	-	10,91	2.119.162,55	3,19	10,91	2.119.162,55	3,19
5	Pek. Lantai Beton Lantai Fc' 10 Mpa Tebal 5 Cm	3,40	m3	1.327.321,96	4.512.894,66	6,80	-	-	-	3,40	4.512.894,66	6,80	3,40	4.512.894,66	6,80
6	Pek. Wiremesh M8	172,49	kg	14.561,39	2.511.694,16	3,78	-	-	-	172,49	2.511.694,16	3,78	172,49	2.511.694,16	3,78
7	Pek. Pemasangan Plastik cor	68,08	m2	2.800,00	190.624,00	0,29	-	-	-	68,08	190.624,00	0,29	68,08	190.624,00	0,29
	Sub Total				31.268.460,63	47,10		-	-		31.268.460,63	47,10		31.268.460,63	47,10
V	PEKERJAAN ATAP														
1	Pek. Rangka Atap Hollow Galvanish 4x4 & 4x6 cm tebal 1,0 mm	381,81	kg	29.600,00	11.301.576,00	17,03	-	-	-	381,81	11.301.576,00	17,03	381,81	11.301.576,00	17,03
2	Pek. Penutup Atap Galvalum Metal Tebal 0.30 mm	81,12	m2	76.221,77	6.183.109,98	9,31	-	-	-	81,12	6.183.109,98	9,31	81,12	6.183.109,98	9,31

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA			BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
3	Pek. Talang Profil + Pengecatan	-	m'	198.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pipa Air Hujan PVC Tipe AWW uk. 2,5"	-	m'	90.055,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Lislank Profil Ornamen Hollow + Pengecatan	-	m'	98.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pengecatan Hollow dengan Cat Minyak Merk Avian	47,12	m2	42.549,78	2.004.945,63	3,02	-	-	-	47,12	2.004.945,63	3,02	47,12	2.004.945,63	3,02
7	Pek. Pengecatan Kolom dan Balok No Drop	33,38	m2	46.390,66	1.548.520,23	2,33	-	-	-	33,38	1.548.520,23	2,33	33,38	1.548.520,23	2,33
8	Pek. Lislank GRC	25,90	m'	67.643,10	1.751.956,29	2,64	-	-	-	25,90	1.751.956,29	2,64	25,90	1.751.956,29	2,64
Sub Total					22.790.108,14	34,33		-	-		22.790.108,14	34,33		22.790.108,14	34,33
VI PEKERJAAN LISTRIK															
1	Pek. Instalasi Lampu	3,00	bh	134.000,00	402.000,00	0,61	-	-	-	3,00	402.000,00	0,61	3,00	402.000,00	0,61
2	Pek. Sakelar Triple	-	bh	46.378,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan Lampu LED 18 watt	3,00	bh	126.257,35	378.772,05	0,57	-	-	-	3,00	378.772,05	0,57	3,00	378.772,05	0,57
4	Pek. Sakelar Tunggal	1,00	bh	31.443,30	31.443,30	0,05	-	-	-	1,00	31.443,30	0,05	1,00	31.443,30	0,05
5	Pek. Sakelar Ganda	1,00	bh	34.852,47	34.852,47	0,05	-	-	-	1,00	34.852,47	0,05	1,00	34.852,47	0,05
Sub Total					847.067,82	1,28		-	-		847.067,82	1,28		847.067,82	1,28
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI					66.381.319,57	100,00		-	-		66.381.319,57	100,00		66.381.319,57	100,00
PPN 11 %					7.301.945,15			-			7.301.945,15			7.301.945,15	
JUMLAH KESELURUHAN					73.683.264,73			-			73.683.264,73			73.683.264,73	
JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN					73.683.000,00			-			73.683.000,00			73.683.000,00	

Pekalongan, 20 April 2025

Mengetahui:
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)



M. ROPIKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



NI'MATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. BINA REKATAMA



NOVI LIYANA, S.Pd.
Direktur

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BERKAH ABISATYA



SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

TIME SCHEDULE

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
 LOKASI : KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	Bulan ke 1 / Minggu Ke				Bulan ke 2
				1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	927.000,00	1,40	0,70				0,70
II	PEKERJAAN TANAH	4.167.076,60	6,28	3,14	3,14			
III	PEKERJAAN PASANGAN	6.381.606,39	9,61		9,61			
IV	PEKERJAAN BETON	31.268.460,63	47,10		14,13	32,97		
V	PEKERJAAN ATAP	22.790.108,14	34,33			13,73	20,60	
VI	PEKERJAAN LISTRIK	847.067,82	1,28				1,28	
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI		66.381.319,57	100,00					
RENCANA PROGRES MINGGUAN (%)				3,84	26,88	46,71	21,88	0,70
RENCANA KOMULATIF PROGRES MINGGUAN (%)				3,84	30,72	77,43	99,30	100,00
REALISASI PROGRES MINGGUAN (%)				17,64	36,17	21,57	24,63	
REALISASI KOMULATIF PROGRES MINGGUAN (%)				17,64	53,81	75,37	100,00	
DEVIASI				13,80	23,08	-2,05	0,70	

— RENCANA
 — REALISASI

Pekalongan, 20 April 2025

Mengetahui:

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPKom)


 M. ROFIKIN, S.M.

NIP. 19731015 199501 1 001

Menyetujui :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



NI'MATUN NAZILAH, S.H.
 NIP. 19701119 199003 2 002

Diperiksa oleh :

Konsultan Pengawas
CV. BINA REKATAMA



NOVI LIYANA, S.Pd.
 Direktur

Dibuat oleh :

Kontraktor Pelaksana
CV. BERKAH ABISATYA



SENO ADI DOYO, S.Kom.
 Direktur



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seruni No 66 Telp. (0285) 421600 - 51122 - Pekalongan

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN
LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
LOKASI : KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

Minggu Ke : I (SATU)
Periode Tanggal : 26 Maret 2025 s/d 01 April 2025

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	PEKERJAAN TEREALISASI	
				JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	927.000,00	1,40	833.500,00	1,26
II	PEKERJAAN TANAH	4.167.076,60	6,28	1.598.224,92	2,41
III	PEKERJAAN PASANGAN	6.381.606,39	9,61	882.881,52	1,33
IV	PEKERJAAN BETON	31.268.460,63	47,10	8.394.122,81	12,65
V	PEKERJAAN ATAP	22.790.108,14	34,33	-	-
VI	PEKERJAAN LISTRIK	847.067,82	1,28	-	-
	JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI	66.381.319,57	100,00	11.708.729,24	17,64
	PPN 11%	7.301.945,15		1.287.960,22	
	JUMLAH KESELURUHAN	73.683.264,73		12.996.689,46	
	JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN	73.683.000,00		12.996.000,00	

RENCANA PEKERJAAN S/D MINGGU INI	3,84 %
REALISASI PEKERJAAN S/D MINGGU INI	17,64 %
DEVIASI ----->	MENDAHULUI RENCANA 13,80 %

Pekalongan, 01 April 2025

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

NI'MATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. BINA REKATAMA

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
LOKASI	: KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

Minggu Ke : I (SATU)
Periode Tanggal : 26 Maret 2025 s/d 01 April 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pek. Uitzet / Pengukuran	1,00	set	320.000,00	320.000,00	0,48	-	-	-	1,00	320.000,00	0,48	1,00	320.000,00	0,48
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	1,00	set	140.000,00	140.000,00	0,21	-	-	-	1,00	140.000,00	0,21	1,00	140.000,00	0,21
3	Pek. K3	1,00	set	280.000,00	280.000,00	0,42	-	-	-	1,00	280.000,00	0,42	1,00	280.000,00	0,42
4	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00	set	187.000,00	187.000,00	0,28	-	-	-	0,50	93.500,00	0,14	0,50	93.500,00	0,14
	Sub Total				927.000,00	1,40		-	-		833.500,00	1,26		833.500,00	1,26
II	PEKERJAAN TANAH														
1	Pek. Galian Tanah Biasa	11,64	m3	100.993,00	1.175.558,52	1,77	-	-	-	11,64	1.175.558,52	1,77	11,64	1.175.558,52	1,77
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	5,43	m3	67.275,00	365.303,25	0,55	-	-	-	3,26	219.181,95	0,33	3,26	219.181,95	0,33
3	Pek. Urugan Pasir	0,65	m3	313.053,00	203.484,45	0,31	-	-	-	0,65	203.484,45	0,31	0,65	203.484,45	0,31
4	Pek. Urugan Sirtu	10,27	m3	235.903,64	2.422.730,38	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				4.167.076,60	6,28		-	-		1.598.224,92	2,41		1.598.224,92	2,41
III	PEKERJAAN PASANGAN														
1	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah (camp. 1Pc : 6Ps muntlan)	3,44	m3	1.138.412,60	3.916.139,34	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pas. Anstamping	1,30	m3	679.139,63	882.881,52	1,33	-	-	-	1,30	882.881,52	1,33	1,30	882.881,52	1,33
3	Pek. Acian Kolom dan Balok	33,38	m2	47.411,19	1.582.585,52	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				6.381.606,39	9,61		-	-		882.881,52	1,33		882.881,52	1,33
IV	PEKERJAAN BETON														
1	Pek. Pondasi Footplat (70x70) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,78	m3	1.424.350,20	1.110.993,16	1,67	-	-	-	0,78	1.110.993,16	1,67	0,78	1.110.993,16	1,67
	b. Tulangan	136,36	kg	14.822,86	2.021.245,19	3,04	-	-	-	136,36	2.021.245,19	3,04	136,36	2.021.245,19	3,04
	c. Bekisting	4,48	m2	165.576,38	741.782,18	1,12	-	-	-	4,48	741.782,18	1,12	4,48	741.782,18	1,12
2	Pek. Sloof (12x18) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,65	m3	1.424.350,20	925.827,63	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Tulangan	154,83	kg	14.822,86	2.295.023,41	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Bekisting	10,80	m2	171.257,38	1.849.579,70	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Kolom K1 (20x20) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	1,40	m3	1.424.350,20	1.994.090,28	3,00	-	-	-	0,32	455.792,06	0,69	0,32	455.792,06	0,69
	b. Tulangan	201,29	kg	14.822,86	2.983.693,49	4,49	-	-	-	201,29	2.983.693,49	4,49	201,29	2.983.693,49	4,49
	c. Bekisting	27,14	m2	191.598,71	5.199.988,99	7,83	-	-	-	5,64	1.080.616,72	1,63	5,64	1.080.616,72	1,63
4	Pek. Balok (15x25) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,63	m3	1.424.350,20	897.340,63	1,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Tulangan	129,16	kg	14.822,86	1.914.520,60	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Bekisting	10,91	m2	194.240,38	2.119.162,55	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Lantai Beton Lantai Fc' 10 Mpa Tebal 5 Cm	3,40	m3	1.327.321,96	4.512.894,66	6,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Wiremesh M6	172,49	kg	14.561,39	2.511.694,16	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pemasangan Plastik cor	68,08	m2	2.800,00	190.624,00	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				31.268.460,63	47,10		-	-		8.394.122,81	12,65		8.394.122,81	12,65
V	PEKERJAAN ATAP														
1	Pek. Rangka Atap Hollow Galvanish 4x4 & 4x6 cm tebal 1,0 mm	381,81	kg	29.600,00	11.301.576,00	17,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Penutup Atap Galvalum Metal Tebal 0.30 mm	81,12	m2	76.221,77	6.183.109,98	9,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
3	Pek. Talang Profil + Pengecatan	-	m'	198.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pipa Air Hujan PVC Tipe AW uk. 2,5"	-	m'	90.055,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Lisplank Profil Ornamen Hollow + Pengecatan	-	m'	98.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pengecatan Hollow dengan Cat Minyak Merk Avian	47,12	m2	42.549,78	2.004.945,63	3,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pengecatan Kolom dan Balok No Drop	33,38	m2	46.390,66	1.548.520,23	2,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Lisplank GRC	25,90	m'	67.643,10	1.751.956,29	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total					22.790.108,14	34,33		-	-		-	-		-	-
VI PEKERJAAN LISTRIK															
1	Pek. Instalasi Lampu	3,00	bh	134.000,00	402.000,00	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Sakelar Triple	-	bh	46.378,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan Lampu LED 18 watt	3,00	bh	126.257,35	378.772,05	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Sakelar Tunggal	1,00	bh	31.443,30	31.443,30	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Sakelar Ganda	1,00	bh	34.852,47	34.852,47	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total					847.067,82	1,28		-	-		-	-		-	-
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI					66.381.319,57	100,00		-	-		11.708.729,24	17,64		11.708.729,24	17,64
PPN 11 %					7.301.945,15			-			1.287.960,22			1.287.960,22	
JUMLAH KESELURUHAN					73.683.264,73			-			12.996.689,46			12.996.689,46	
JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN					73.683.000,00			-			12.996.000,00			12.996.000,00	

Pekalongan, 01 April 2025

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

NIRMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. BINA REKATAMA

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
LOKASI : KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

Minggu Ke : II (DUA)
Periode Tanggal : 02 April 2025 s/d 08 April 2025

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	PEKERJAAN TEREALISASI	
				JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	927.000,00	1,40	833.500,00	1,26
II	PEKERJAAN TANAH	4.167.076,60	6,28	4.167.076,60	6,28
III	PEKERJAAN PASANGAN	6.381.606,39	9,61	4.799.020,86	7,23
IV	PEKERJAAN BETON	31.268.460,63	47,10	25.916.930,91	39,04
V	PEKERJAAN ATAP	22.790.108,14	34,33	-	-
VI	PEKERJAAN LISTRIK	847.067,82	1,28	-	-
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI		66.381.319,57	100,00	35.716.528,37	53,81
PPN 11%		7.301.945,15		3.928.818,12	
JUMLAH KESELURUHAN		73.683.264,73		39.645.346,49	
JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN		73.683.000,00		39.645.000,00	

RENCANA PEKERJAAN S/D MINGGU INI	30,72 %
REALISASI PEKERJAAN S/D MINGGU INI	53,81 %
DEVIASI ----->	MENDAHULUI RENCANA 23,08 %

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


NI'MATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. BINA REKATAMA


M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

Pekalongan, 08 April 2025

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BERKAH ABISATYA


SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
LOKASI	: KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

Minggu Ke : II (DUA)
Periode Tanggal : 02 April 2025 s/d 08 April 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pek. Uitzet / Pengukuran	1,00	set	320.000,00	320.000,00	0,48	1,00	320.000,00	0,48	-	-	-	1,00	320.000,00	0,48
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	1,00	set	140.000,00	140.000,00	0,21	1,00	140.000,00	0,21	-	-	-	1,00	140.000,00	0,21
3	Pek. K3	1,00	set	280.000,00	280.000,00	0,42	1,00	280.000,00	0,42	-	-	-	1,00	280.000,00	0,42
4	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00	set	187.000,00	187.000,00	0,28	0,50	93.500,00	0,14	-	-	-	0,50	93.500,00	0,14
	Sub Total				927.000,00	1,40		833.500,00	1,26		-	-		833.500,00	1,26
II	PEKERJAAN TANAH														
1	Pek. Galian Tanah Biasa	11,64	m3	100.993,00	1.175.558,52	1,77	11,64	1.175.558,52	1,77	-	-	-	11,64	1.175.558,52	1,77
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	5,43	m3	67.275,00	365.303,25	0,55	3,26	219.181,95	0,33	2,17	146.121,30	0,22	5,43	365.303,25	0,55
3	Pek. Urugan Pasir	0,65	m3	313.053,00	203.484,45	0,31	0,65	203.484,45	0,31	-	-	-	0,65	203.484,45	0,31
4	Pek. Urugan Sirtu	10,27	m3	235.903,64	2.422.730,38	3,65	-	-	-	10,27	2.422.730,38	3,65	10,27	2.422.730,38	3,65
	Sub Total				4.167.076,60	6,28		1.598.224,92	2,41		2.568.851,68	3,87		4.167.076,60	6,28
III	PEKERJAAN PASANGAN														
1	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah (camp. 1Pc : 6Ps muntilan)	3,44	m3	1.138.412,60	3.916.139,34	5,90	-	-	-	3,44	3.916.139,34	5,90	3,44	3.916.139,34	5,90
2	Pek. Pas. Anstamping	1,30	m3	679.139,63	882.881,52	1,33	1,30	882.881,52	1,33	-	-	-	1,30	882.881,52	1,33
3	Pek. Acian Kolom dan Balok	33,38	m2	47.411,19	1.582.585,52	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				6.381.606,39	9,61		882.881,52	1,33		3.916.139,34	5,90		4.799.020,86	7,23
IV	PEKERJAAN BETON														
1	Pek. Pondasi Footplat (70x70) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,78	m3	1.424.350,20	1.110.993,16	1,67	0,78	1.110.993,16	1,67	-	-	-	0,78	1.110.993,16	1,67
	b. Tulangan	136,36	kg	14.822,86	2.021.245,19	3,04	136,36	2.021.245,19	3,04	-	-	-	136,36	2.021.245,19	3,04
	c. Bekisting	4,48	m2	165.576,38	741.782,18	1,12	4,48	741.782,18	1,12	-	-	-	4,48	741.782,18	1,12
2	Pek. Sloof (12x18) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,65	m3	1.424.350,20	925.827,63	1,39	-	-	-	0,65	925.827,63	1,39	0,65	925.827,63	1,39
	b. Tulangan	154,83	kg	14.822,86	2.295.023,41	3,46	-	-	-	154,83	2.295.023,41	3,46	154,83	2.295.023,41	3,46
	c. Bekisting	10,80	m2	171.257,38	1.849.579,70	2,79	-	-	-	10,80	1.849.579,70	2,79	10,80	1.849.579,70	2,79
3	Pek. Kolom K1 (20x20) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	1,40	m3	1.424.350,20	1.994.090,28	3,00	0,32	455.792,06	0,69	1,00	1.424.350,20	2,15	1,32	1.880.142,26	2,83
	b. Tulangan	201,29	kg	14.822,86	2.983.693,49	4,49	201,29	2.983.693,49	4,49	-	-	-	201,29	2.983.693,49	4,49
	c. Bekisting	27,14	m2	191.598,71	5.199.988,99	7,83	5,64	1.080.616,72	1,63	19,90	3.812.814,33	5,74	25,54	4.893.431,05	7,37
4	Pek. Balok (15x25) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,63	m3	1.424.350,20	897.340,63	1,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Tulangan	129,16	kg	14.822,86	1.914.520,60	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Bekisting	10,91	m2	194.240,38	2.119.162,55	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Lantai Beton Lantai Fc' 10 Mpa Tebal 5 Cm	3,40	m3	1.327.321,96	4.512.894,66	6,80	-	-	-	3,40	4.512.894,66	6,80	3,40	4.512.894,66	6,80
6	Pek. Wiremesh M6	172,49	kg	14.561,39	2.511.694,16	3,78	-	-	-	172,49	2.511.694,16	3,78	172,49	2.511.694,16	3,78
7	Pek. Pemasangan Plastik cor	68,08	m2	2.800,00	190.624,00	0,29	-	-	-	68,08	190.624,00	0,29	68,08	190.624,00	0,29
	Sub Total				31.268.460,63	47,10		8.394.122,81	12,65		17.522.808,10	26,40		25.916.930,91	39,04
V	PEKERJAAN ATAP														
1	Pek. Rangka Atap Hollow Galvanish 4x4 & 4x6 cm tebal 1,0 mm	381,81	kg	29.600,00	11.301.576,00	17,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Penutup Atap Galvalum Metal Tebal 0.30 mm	81,12	m2	76.221,77	6.183.109,98	9,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
3	Pek. Talang Profil + Pengecatan	-	m'	198.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pipa Air Hujan PVC Tipe AWW uk. 2,5"	-	m'	90.055,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Liplank Profil Ornamen Hollow + Pengecatan	-	m'	98.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pengecatan Hollow dengan Cat Minyak Merk Avian	47,12	m2	42.549,78	2.004.945,63	3,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pengecatan Kolom dan Balok No Drop	33,38	m2	46.390,66	1.548.520,23	2,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Liplank GRC	25,90	m'	67.643,10	1.751.956,29	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total					22.790.108,14	34,33		-	-		-	-		-	-
VI	PEKERJAAN LISTRIK														
1	Pek. Instalasi Lampu	3,00	bh	134.000,00	402.000,00	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Sakelar Triple	-	bh	46.378,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan Lampu LED 18 watt	3,00	bh	126.257,35	378.772,05	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Sakelar Tunggal	1,00	bh	31.443,30	31.443,30	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Sakelar Ganda	1,00	bh	34.852,47	34.852,47	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total					847.067,82	1,28		-	-		-	-		-	-
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI					66.381.319,57	100,00		11.708.729,24	17,64		24.007.799,13	36,17		35.716.528,37	53,81
PPN 11 %					7.301.945,15			1.287.960,22			2.640.857,90			3.928.818,12	
JUMLAH KESELURUHAN					73.683.264,73			12.996.689,46			26.648.657,03			39.645.346,49	
JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN					73.683.000,00			12.996.000,00			26.648.000,00			39.645.000,00	

Pekalongan, 08 April 2025

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

NI'MATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. BINA REKATAMA

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
LOKASI : KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

Minggu Ke : III (TIGA)
Periode Tanggal : 09 April 2025 s/d 15 April 2025

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	PEKERJAAN TEREALISASI	
				JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	927.000,00	1,40	833.500,00	1,26
II	PEKERJAAN TANAH	4.167.076,60	6,28	4.167.076,60	6,28
III	PEKERJAAN PASANGAN	6.381.606,39	9,61	6.381.606,39	9,61
IV	PEKERJAAN BETON	31.268.460,63	47,10	31.268.460,63	47,10
V	PEKERJAAN ATAP	22.790.108,14	34,33	7.382.429,29	11,12
VI	PEKERJAAN LISTRIK	847.067,82	1,28	-	-
	JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI	66.381.319,57	100,00	50.033.072,91	75,37
	PPN 11%	7.301.945,15		5.503.638,02	
	JUMLAH KESELURUHAN	73.683.264,73		55.536.710,93	
	JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN	73.683.000,00		55.536.000,00	

RENCANA PEKERJAAN S/D MINGGU INI	77,43 %
REALISASI PEKERJAAN S/D MINGGU INI	75,37 %
DEVIASI ----->	KURANG DARI RENCANA -2,05 %

Pekalongan, 15 April 2025

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

NI'MATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. BINA REKATAMA

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
LOKASI	: KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

Minggu Ke : III (TIGA)
Periode Tanggal : 09 April 2025 s/d 15 April 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pek. Uitzet / Pengukuran	1,00	set	320.000,00	320.000,00	0,48	1,00	320.000,00	0,48	-	-	-	1,00	320.000,00	0,48
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	1,00	set	140.000,00	140.000,00	0,21	1,00	140.000,00	0,21	-	-	-	1,00	140.000,00	0,21
3	Pek. K3	1,00	set	280.000,00	280.000,00	0,42	1,00	280.000,00	0,42	-	-	-	1,00	280.000,00	0,42
4	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00	set	187.000,00	187.000,00	0,28	0,50	93.500,00	0,14	-	-	-	0,50	93.500,00	0,14
	Sub Total				927.000,00	1,40		833.500,00	1,26		-	-		833.500,00	1,26
II	PEKERJAAN TANAH														
1	Pek. Galian Tanah Biasa	11,64	m3	100.993,00	1.175.558,52	1,77	11,64	1.175.558,52	1,77	-	-	-	11,64	1.175.558,52	1,77
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	5,43	m3	67.275,00	365.303,25	0,55	5,43	365.303,25	0,55	-	-	-	5,43	365.303,25	0,55
3	Pek. Urugan Pasir	0,65	m3	313.053,00	203.484,45	0,31	0,65	203.484,45	0,31	-	-	-	0,65	203.484,45	0,31
4	Pek. Urugan Sirtu	10,27	m3	235.903,64	2.422.730,38	3,65	10,27	2.422.730,38	3,65	-	-	-	10,27	2.422.730,38	3,65
	Sub Total				4.167.076,60	6,28		4.167.076,60	6,28		-	-		4.167.076,60	6,28
III	PEKERJAAN PASANGAN														
1	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah (camp. 1Pc : 6Ps muntlan)	3,44	m3	1.138.412,60	3.916.139,34	5,90	3,44	3.916.139,34	5,90	-	-	-	3,44	3.916.139,34	5,90
2	Pek. Pas. Anstamping	1,30	m3	679.139,63	882.881,52	1,33	1,30	882.881,52	1,33	-	-	-	1,30	882.881,52	1,33
3	Pek. Acian Kolom dan Balok	33,38	m2	47.411,19	1.582.585,52	2,38	-	-	-	33,38	1.582.585,52	2,38	33,38	1.582.585,52	2,38
	Sub Total				6.381.606,39	9,61		4.799.020,86	7,23		1.582.585,52	2,38		6.381.606,39	9,61
IV	PEKERJAAN BETON														
1	Pek. Pondasi Footplat (70x70) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,78	m3	1.424.350,20	1.110.993,16	1,67	0,78	1.110.993,16	1,67	-	-	-	0,78	1.110.993,16	1,67
	b. Tulangan	136,36	kg	14.822,86	2.021.245,19	3,04	136,36	2.021.245,19	3,04	-	-	-	136,36	2.021.245,19	3,04
	c. Bekisting	4,48	m2	165.576,38	741.782,18	1,12	4,48	741.782,18	1,12	-	-	-	4,48	741.782,18	1,12
2	Pek. Sloof (12x18) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,65	m3	1.424.350,20	925.827,63	1,39	0,65	925.827,63	1,39	-	-	-	0,65	925.827,63	1,39
	b. Tulangan	154,83	kg	14.822,86	2.295.023,41	3,46	154,83	2.295.023,41	3,46	-	-	-	154,83	2.295.023,41	3,46
	c. Bekisting	10,80	m2	171.257,38	1.849.579,70	2,79	10,80	1.849.579,70	2,79	-	-	-	10,80	1.849.579,70	2,79
3	Pek. Kolom K1 (20x20) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	1,40	m3	1.424.350,20	1.994.090,28	3,00	1,32	1.880.142,26	2,83	0,08	113.948,02	0,17	1,40	1.994.090,28	3,00
	b. Tulangan	201,29	kg	14.822,86	2.983.693,49	4,49	201,29	2.983.693,49	4,49	-	-	-	201,29	2.983.693,49	4,49
	c. Bekisting	27,14	m2	191.598,71	5.199.988,99	7,83	25,54	4.893.431,05	7,37	1,60	306.557,94	0,46	27,14	5.199.988,99	7,83
4	Pek. Balok (15x25) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,63	m3	1.424.350,20	897.340,63	1,35	-	-	-	0,63	897.340,63	1,35	0,63	897.340,63	1,35
	b. Tulangan	129,16	kg	14.822,86	1.914.520,60	2,88	-	-	-	129,16	1.914.520,60	2,88	129,16	1.914.520,60	2,88
	c. Bekisting	10,91	m2	194.240,38	2.119.162,55	3,19	-	-	-	10,91	2.119.162,55	3,19	10,91	2.119.162,55	3,19
5	Pek. Lantai Beton Lantai Fc' 10 Mpa Tebal 5 Cm	3,40	m3	1.327.321,96	4.512.894,66	6,80	3,40	4.512.894,66	6,80	-	-	-	3,40	4.512.894,66	6,80
6	Pek. Wiremesh M6	172,49	kg	14.561,39	2.511.694,16	3,78	172,49	2.511.694,16	3,78	-	-	-	172,49	2.511.694,16	3,78
7	Pek. Pemasangan Plastik cor	68,08	m2	2.800,00	190.624,00	0,29	68,08	190.624,00	0,29	-	-	-	68,08	190.624,00	0,29
	Sub Total				31.268.460,63	47,10		25.916.930,91	39,04		5.351.529,72	8,06		31.268.460,63	47,10
V	PEKERJAAN ATAP														
1	Pek. Rangka Atap Hollow Galvanish 4x4 & 4x6 cm tebal 1,0 mm	381,81	kg	29.600,00	11.301.576,00	17,03	-	-	-	229,09	6.780.945,60	10,22	229,09	6.780.945,60	10,22
2	Pek. Penutup Atap Galvalum Metal Tebal 0.30 mm	81,12	m2	76.221,77	6.183.109,98	9,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
3	Pek. Talang Profil + Pengecatan	-	m'	198.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pipa Air Hujan PVC Tipe AW uk. 2,5"	-	m'	90.055,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Lisplank Profil Ornamen Hollow + Pengecatan	-	m'	98.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pengecatan Hollow dengan Cat Minyak Merk Avian	47,12	m2	42.549,78	2.004.945,63	3,02	-	-	-	14,14	601.483,69	0,91	14,14	601.483,69	0,91
7	Pek. Pengecatan Kolom dan Balok No Drop	33,38	m2	46.390,66	1.548.520,23	2,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Lisplank GRC	25,90	m'	67.643,10	1.751.956,29	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total					22.790.108,14	34,33		-	-		7.382.429,29	11,12		7.382.429,29	11,12
VI	PEKERJAAN LISTRIK														
1	Pek. Instalasi Lampu	3,00	bh	134.000,00	402.000,00	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Sakelar Triple	-	bh	46.378,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan Lampu LED 18 watt	3,00	bh	126.257,35	378.772,05	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Sakelar Tunggal	1,00	bh	31.443,30	31.443,30	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Sakelar Ganda	1,00	bh	34.852,47	34.852,47	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total					847.067,82	1,28		-	-		-	-		-	-
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI					66.381.319,57	100,00		35.716.528,37	53,81		14.316.544,53	21,57		50.033.072,91	75,37
PPN 11 %					7.301.945,15			3.928.818,12			1.574.819,90			5.603.638,02	
JUMLAH KESELURUHAN					73.683.264,73			39.645.346,49			15.891.364,43			55.536.710,93	
JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN					73.683.000,00			39.645.000,00			15.891.000,00			55.536.000,00	

Pekalongan, 15 April 2025

Menyetujui :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

N'IMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas

CV. BINA REKATAMA

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :

Kontraktor Pelaksana
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
LOKASI : KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

Minggu Ke : IV (EMPAT)
Periode Tanggal : 16 April 2025 s/d 20 April 2025

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	PEKERJAAN TEREALISASI	
				JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	927.000,00	1,40	927.000,00	1,40
II	PEKERJAAN TANAH	4.167.076,60	6,28	4.167.076,60	6,28
III	PEKERJAAN PASANGAN	6.381.606,39	9,61	6.381.606,39	9,61
IV	PEKERJAAN BETON	31.268.460,63	47,10	31.268.460,63	47,10
V	PEKERJAAN ATAP	22.790.108,14	34,33	22.790.108,14	34,33
VI	PEKERJAAN LISTRIK	847.067,82	1,28	847.067,82	1,28
	JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI	66.381.319,57	100,00	66.381.319,57	100,00
	PPN 11%	7.301.945,15		7.301.945,15	
	JUMLAH KESELURUHAN	73.683.264,73		73.683.264,73	
	JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN	73.683.000,00		73.683.000,00	

RENCANA PEKERJAAN S/D MINGGU INI	99,30 %
REALISASI PEKERJAAN S/D MINGGU INI	100,00 %
DEVIASI ----->	MENDAHULUI RENCANA 0,70 %

Pekalongan, 20 April 2025

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

NI'MATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. BINA REKATAMA

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
LOKASI : KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

Minggu Ke : IV (EMPAT)
Periode Tanggal : 16 April 2025 s/d 20 April 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pek. Uitzet / Pengukuran	1,00	set	320.000,00	320.000,00	0,48	1,00	320.000,00	0,48	-	-	-	1,00	320.000,00	0,48
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	1,00	set	140.000,00	140.000,00	0,21	1,00	140.000,00	0,21	-	-	-	1,00	140.000,00	0,21
3	Pek. K3	1,00	set	280.000,00	280.000,00	0,42	1,00	280.000,00	0,42	-	-	-	1,00	280.000,00	0,42
4	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00	set	187.000,00	187.000,00	0,28	0,50	93.500,00	0,14	0,50	93.500,00	0,14	1,00	187.000,00	0,28
	Sub Total				927.000,00	1,40		833.500,00	1,26		93.500,00	0,14		927.000,00	1,40
II	PEKERJAAN TANAH														
1	Pek. Galian Tanah Biasa	11,64	m3	100.993,00	1.175.558,52	1,77	11,64	1.175.558,52	1,77	-	-	-	11,64	1.175.558,52	1,77
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	5,43	m3	67.275,00	365.303,25	0,55	5,43	365.303,25	0,55	-	-	-	5,43	365.303,25	0,55
3	Pek. Urugan Pasir	0,65	m3	313.053,00	203.484,45	0,31	0,65	203.484,45	0,31	-	-	-	0,65	203.484,45	0,31
4	Pek. Urugan Sirtu	10,27	m3	235.903,64	2.422.730,38	3,65	10,27	2.422.730,38	3,65	-	-	-	10,27	2.422.730,38	3,65
	Sub Total				4.167.076,60	6,28		4.167.076,60	6,28		-	-		4.167.076,60	6,28
III	PEKERJAAN PASANGAN														
1	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah (camp. 1Pc : 6Ps muntilan)	3,44	m3	1.138.412,60	3.916.139,34	5,90	3,44	3.916.139,34	5,90	-	-	-	3,44	3.916.139,34	5,90
2	Pek. Pas. Anstamping	1,30	m3	679.139,63	882.881,52	1,33	1,30	882.881,52	1,33	-	-	-	1,30	882.881,52	1,33
3	Pek. Acian Kolom dan Balok	33,38	m2	47.411,19	1.582.585,52	2,38	33,38	1.582.585,52	2,38	-	-	-	33,38	1.582.585,52	2,38
	Sub Total				6.381.606,39	9,61		6.381.606,39	9,61		-	-		6.381.606,39	9,61
IV	PEKERJAAN BETON														
1	Pek. Pondasi Footplat (70x70) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,78	m3	1.424.350,20	1.110.993,16	1,67	0,78	1.110.993,16	1,67	-	-	-	0,78	1.110.993,16	1,67
	b. Tulangan	136,36	kg	14.822,86	2.021.245,19	3,04	136,36	2.021.245,19	3,04	-	-	-	136,36	2.021.245,19	3,04
	c. Bekisting	4,48	m2	165.576,38	741.782,18	1,12	4,48	741.782,18	1,12	-	-	-	4,48	741.782,18	1,12
2	Pek. Sloof (12x18) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,65	m3	1.424.350,20	925.827,63	1,39	0,65	925.827,63	1,39	-	-	-	0,65	925.827,63	1,39
	b. Tulangan	154,83	kg	14.822,86	2.295.023,41	3,46	154,83	2.295.023,41	3,46	-	-	-	154,83	2.295.023,41	3,46
	c. Bekisting	10,80	m2	171.257,38	1.849.579,70	2,79	10,80	1.849.579,70	2,79	-	-	-	10,80	1.849.579,70	2,79
3	Pek. Kolom K1 (20x20) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	1,40	m3	1.424.350,20	1.994.090,28	3,00	1,40	1.994.090,28	3,00	-	-	-	1,40	1.994.090,28	3,00
	b. Tulangan	201,29	kg	14.822,86	2.983.693,49	4,49	201,29	2.983.693,49	4,49	-	-	-	201,29	2.983.693,49	4,49
	c. Bekisting	27,14	m2	191.598,71	5.199.988,99	7,83	27,14	5.199.988,99	7,83	-	-	-	27,14	5.199.988,99	7,83
4	Pek. Balok (15x25) cm														
	a. Beton mutu fc' 20Mpa	0,63	m3	1.424.350,20	897.340,63	1,35	0,63	897.340,63	1,35	-	-	-	0,63	897.340,63	1,35
	b. Tulangan	129,16	kg	14.822,86	1.914.520,60	2,88	129,16	1.914.520,60	2,88	-	-	-	129,16	1.914.520,60	2,88
	c. Bekisting	10,91	m2	194.240,38	2.119.162,55	3,19	10,91	2.119.162,55	3,19	-	-	-	10,91	2.119.162,55	3,19
5	Pek. Lantai Beton Lantai Fc' 10 Mpa Tebal 5 Cm	3,40	m3	1.327.321,96	4.512.894,66	6,80	3,40	4.512.894,66	6,80	-	-	-	3,40	4.512.894,66	6,80
6	Pek. Wiremesh M6	172,49	kg	14.561,39	2.511.694,16	3,78	172,49	2.511.694,16	3,78	-	-	-	172,49	2.511.694,16	3,78
7	Pek. Pemasangan Plastik cor	68,08	m2	2.800,00	190.624,00	0,29	68,08	190.624,00	0,29	-	-	-	68,08	190.624,00	0,29
	Sub Total				31.268.460,63	47,10		31.268.460,63	47,10		-	-		31.268.460,63	47,10
V	PEKERJAAN ATAP														
1	Pek. Rangka Atap Hollow Galvanish 4x4 & 4x6 cm tebal 1,0 mm	381,81	kg	29.600,00	11.301.576,00	17,03	229,09	6.780.945,60	10,22	152,72	4.520.630,40	6,81	381,81	11.301.576,00	17,03
2	Pek. Penutup Atap Galvalum Metal Tebal 0.30 mm	81,12	m2	76.221,77	6.183.109,98	9,31	-	-	-	81,12	6.183.109,98	9,31	81,12	6.183.109,98	9,31

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
3	Pek. Talang Profil + Pengecatan	-	m'	198.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pipa Air Hujan PVC Tipe AW uk. 2,5"	-	m'	90.055,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Lisplank Profil Ornamen Hollow + Pengecatan	-	m'	98.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pengecatan Hollow dengan Cat Minyak Merk Avian	47,12	m2	42.549,78	2.004.945,63	3,02	14,14	601.483,69	0,91	32,98	1.403.461,94	2,11	47,12	2.004.945,63	3,02
7	Pek. Pengecatan Kolom dan Balok No Drop	33,38	m2	46.390,66	1.548.520,23	2,33	-	-	-	33,38	1.548.520,23	2,33	33,38	1.548.520,23	2,33
8	Pek. Lisplank GRC	25,90	m'	67.643,10	1.751.956,29	2,64	-	-	-	25,90	1.751.956,29	2,64	25,90	1.751.956,29	2,64
Sub Total					22.790.108,14	34,33		7.382.429,29	11,12		15.407.678,85	23,21		22.790.108,14	34,33
VI PEKERJAAN LISTRIK															
1	Pek. Instalasi Lampu	3,00	bh	134.000,00	402.000,00	0,61	-	-	-	3,00	402.000,00	0,61	3,00	402.000,00	0,61
2	Pek. Sakelar Triple	-	bh	46.378,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan Lampu LED 18 watt	3,00	bh	126.257,35	378.772,05	0,57	-	-	-	3,00	378.772,05	0,57	3,00	378.772,05	0,57
4	Pek. Sakelar Tunggal	1,00	bh	31.443,30	31.443,30	0,05	-	-	-	1,00	31.443,30	0,05	1,00	31.443,30	0,05
5	Pek. Sakelar Ganda	1,00	bh	34.852,47	34.852,47	0,05	-	-	-	1,00	34.852,47	0,05	1,00	34.852,47	0,05
Sub Total					847.067,82	1,28		-	-		847.067,82	1,28		847.067,82	1,28
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI					66.381.319,57	100,00		50.033.072,91	75,37		16.348.246,67	24,63		66.381.319,57	100,00
PPN 11 %					7.301.945,15			5.503.638,02			1.798.307,13			7.301.945,15	
JUMLAH KESELURUHAN					73.683.264,73			55.536.710,93			18.146.553,80			73.683.264,73	
JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN					73.683.000,00			55.536.000,00			18.146.000,00			73.683.000,00	

Pekalongan, 20 April 2025

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

NIMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. BINA REKATAMA

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seruni No 66 Telp. (0285) 421600 - 51122 - Pekalongan

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN
LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			MINGGU KE : I (SATU)	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			HARI : RABU	
TAHUN ANGGARAN : 2025			TANGGAL : 26 Maret 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Ultzet dan Pengukuran	
2.	Logistik/Administrasi	org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	1 org		
5.	Tukang	org		
6.	Pekerja	org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN	
			MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Meteran Roll	1 bh		
2.	Meteran	1 bh		
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA			MINGGU KE : I (SATU)	
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			HARI : KAMIS	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			TANGGAL : 27 Maret 2025	
TAHUN ANGGARAN : 2025				
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Pek. Papan Nama Kegiatan	
2.	Logistik/Administrasi	1 org	2. Pek. K3	
3.	Mandor	org	3. Pek. Pembersihan Lokasi	
4.	Kepala Tukang	1 org	4. Pek. Galian Tanah Blasa	
5.	Tukang	2 org		
6.	Pekerja	4 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN	
			MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Cangkul	6 bh		
2.	Ember	10 bh		
3.	Linggis	2 bh		
4.	Meteran	3 bh		
5.	Palu	4 bh		
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL				
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			MINGGU KE : 1 (SATU)	
TAHUN ANGGARAN : 2025			HARI : SABTU	
			TANGGAL : 29 Maret 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Pek. Galian Tanah Biasa	
2.	Logistik/Administrasi	2 org	2. Pek. Urugan Tanah Kembali	
3.	Mandor	org	3. Pek. Pondasi Footplat (70x70) cm	
4.	Kepala Tukang	1 org	4. Pek. Kolom K1 (20x20) cm	
5.	Tukang	3 org		
6.	Pekerja	4 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN	
			MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Artco	2 bh		
2.	Cangkul	4 bh		
3.	Cetok	5 bh		
4.	Concrete Mixer	1 bh		
5.	Ember	10 bh		
6.	Gergaji	5 bh		
7.	Meteran	4 bh		
8.	Palu	5 bh		
9.	Selang	12 m'		
10.	Tang	4 bh		
11.	Waterpass	1 bh		
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL LOKASI : KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN : 2025			LAPORAN HARIAN MINGGU KE : I (SATU) HARI : MINGGU TANGGAL : 30 Maret 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Pek. Pas. Anstamping	
2.	Logistik/Administrasi	2 org	2. Pek. Kolom KI (20x20) cm	
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	1 org		
5.	Tukang	3 org		
6.	Pekerja	4 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Artco	2 bh		
2.	Cangkul	4 bh		
3.	Cetok	5 bh		
4.	Concrete Mixer	1 bh		
5.	Ember	10 bh		
6.	Gergaji	5 bh		
7.	Meteran	4 bh		
8.	Palu	5 bh		
9.	Selang	12 m'		
10.	Tang	4 bh		
11.	Waterpass	1 bh		
<u>Diperiksa oleh :</u> Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  <u>M. BAGUS SAMPURNO</u> Pengawas Lapangan <u>Dibuat oleh :</u> Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  <u>SENO ADI DOYO, S.Kom.</u> Direktur				


KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			MINGGU KE : I (SATU)	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			HARI : SENIN	
TAHUN ANGGARAN : 2025			TANGGAL : 31 Maret 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	org	1. Tidak Ada Kegiatan	
2.	Logistik/Administrasi	org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	org		
5.	Tukang	org		
6.	Pekerja	org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN	
			MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.				
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			MINGGU KE : 1 (SATU)	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			HARI : SELASA	
TAHUN ANGGARAN : 2025			TANGGAL : 01 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	org	1. Tidak Ada Kegiatan	
2.	Logistik/Administrasi	org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	org		
5.	Tukang	org		
6.	Pekerja	org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN	
			MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.				
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			MINGGU KE : II (DUA)	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			HARI : RABU	
TAHUN ANGGARAN : 2025			TANGGAL : 02 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	org	I. Tidak Ada Kegiatan	
2.	Logistik/Administrasi	org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	org		
5.	Tukang	org		
6.	Pekerja	org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN	
			MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.				
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL				
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			MINGGU KE : II (DUA)	
TAHUN ANGGARAN : 2025			HARI : KAMIS	
			TANGGAL : 03 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	org	1. Tidak Ada Kegiatan	
2.	Logistik/Administrasi	org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	org		
5.	Tukang	org		
6.	Pekerja	org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN	
			MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.				
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			MINGGU KE : II (DUA)	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			HARI : MINGGU	
TAHUN ANGGARAN : 2025			TANGGAL : 06 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Pek. Sloof (12x18) cm	
2.	Logistik/Administrasi	2 org	2. Pek. Urugan Sirtu	
3.	Mandor	org	3. Pek. Wiremesh M6	
4.	Kepala Tukang	1 org	4. Pek. Pemasangan Plastik cor	
5.	Tukang	4 org		
6.	Pekerja	5 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN	
			MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Artco	2 bh		
2.	Cangkul	4 bh		
3.	Cetok	5 bh		
4.	Concrete Mixer	1 bh		
5.	Ember	10 bh		
6.	Gergaji	3 bh		
7.	Mesin Gerinda	2 unit		
8.	Meteran	5 bh		
9.	Palu	5 bh		
10.	Raskam	4 bh		
11.	Tang	3 bh		
12.	Waterpass	1 bh		
13.	Selang	12 m'		
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			MINGGU KE : II (DUA)	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			HARI : SENIN	
TAHUN ANGGARAN : 2025			TANGGAL : 07 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Pek. Lantai Beton Lantai Fc' 10 Mpa Tebal 5 Cm 2. Pek. Wiremesh M6 3. Pek. Kolom K1 (20x20) cm	
2.	Logistik/Administrasi	2 org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	1 org		
5.	Tukang	3 org		
6.	Pekerja	4 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Artco	2 bh		
2.	Cangkul	4 bh		
3.	Cetok	5 bh		
4.	Concrete Mixer	1 bh		
5.	Ember	11 bh		
6.	Gergaji	3 bh		
7.	Mesin Gerinda	2 unit		
8.	Meteran	5 bh		
9.	Palu	5 bh		
10.	Raskam	4 bh		
11.	Tang	3 bh		
12.	Waterpass	1 bh		
13.	Selang	12 m'		
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan			Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur	

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			MINGGU KE : II (DUA)	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			HARI : SELASA	
TAHUN ANGGARAN : 2025			TANGGAL : 08 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Pek. Kolom K1 (20x20) cm	
2.	Logistik/Administrasi	2 org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	1 org		
5.	Tukang	2 org		
6.	Pekerja	3 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN	
			MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 W/IB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Cangkul	3 bh		
2.	Cetok	5 bh		
3.	Concrete Mixer	1 bh		
4.	Ember	10 bh		
5.	Gergaji	3 bh		
6.	Meteran	4 bh		
7.	Palu	4 bh		
8.	Raskam	3 bh		
9.	Tang	2 bh		
10.	Waterpass	1 bh		
11.	Selang	12 m'		
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom, Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			MINGGU KE : III (TIGA)	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			HARI : RABU	
TAHUN ANGGARAN : 2025			TANGGAL : 09 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	org	1. Tidak Ada Kegiatan	
2.	Logistik/Administrasi	org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	org		
5.	Tukang	org		
6.	Pekerja	org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN	
			MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.				
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			MINGGU KE : III (TIGA)	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			HARI : KAMIS	
TAHUN ANGGARAN : 2025			TANGGAL : 10 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Pek. Kolom KI (20x20) cm 2. Pek. Balok (15x25) cm	
2.	Logistik/Administrasi	1 org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	1 org		
5.	Tukang	3 org		
6.	Pekerja	3 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 W/B	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Cangkul	3 bh		
2.	Cetok	4 bh		
3.	Concrete Mixer	1 bh		
4.	Ember	8 bh		
5.	Gergaji	4 bh		
6.	Meteran	4 bh		
7.	Palu	5 bh		
8.	Raskam	2 bh		
9.	Tang	2 bh		
10.	Waterpass	1 bh		
11.	Selang	12 m'		
Dipertksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom, Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			MINGGU KE : III (TIGA)	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			HARI : SABTU	
TAHUN ANGGARAN : 2025			TANGGAL : 12 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Pek. Kolom K1 (20x20) cm 2. Pek. Balok (15x25) cm	
2.	Logistik/Administrasi	org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	1 org		
5.	Tukang	2 org		
6.	Pekerja	2 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Cangkul	3 bh		
2.	Cetok	4 bh		
3.	Concrete Mixer	1 bh		
4.	Ember	8 bh		
5.	Gergaji	3 bh		
6.	Meteran	3 bh		
7.	Palu	4 bh		
8.	Raskam	2 bh		
9.	Tang	2 bh		
10.	Waterpass	1 bh		
11.	Selang	12 m'		
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	LAPORAN HARIAN
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN	MINGGU KE : III (TIGA)
TAHUN ANGGARAN : 2025	HARI : MINGGU
	TANGGAL : 13 April 2025

KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA

NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN
1.	Pelaksana	org	1. Pek. Acian Kolom dan Balok
2.	Logistik/Administrasi	org	2. Pek. Rangka Atap Hollow Galvanish 4x4 & 4x6 cm tebal 1,0 mm
3.	Mandor	org	
4.	Kepala Tukang	1 org	
5.	Tukang	3 org	
6.	Pekerja	2 org	
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN
			MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB

NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Cetok	3 bh		
2.	Ember	5 bh		
3.	Mesin Gerinda	2 unit		
4.	Mesin Las	2 unit		
5.	Meteran	3 bh		
6.	Palu	3 bh		
7.	Raskam	2 bh		
8.	Tang	1 bh		
9.	Waterpass	1 bh		

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. BINA REKATAMA



M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. BERKAH ABISATYA



SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur


KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			MINGGU KE : III (TIGA)	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			HARI : SENIN	
TAHUN ANGGARAN : 2025			TANGGAL : 14 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Pek. Rangka Atap Hollow Galvanish 4x4 & 4x6 cm tebal 1,0 mm	
2.	Logistik/Administrasi	1 org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	org		
5.	Tukang	2 org		
6.	Pekerja	2 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN	
			MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Ember	4 bh		
2.	Mesin Gerinda	2 unit		
3.	Mesin Las	2 unit		
4.	Meteran	3 bh		
5.	Palu	3 bh		
6.	Tang	1 bh		
7.	Waterpass	1 bh		
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL LOKASI : KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN : 2025			LAPORAN HARIAN MINGGU KE : III (TIGA) HARI : SELASA TANGGAL : 15 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	org	1. Pek. Rangka Atap Hollow Galvanish 4x4 & 4x6 cm tebal 1,0 mm 2. Pek. Pengecatan Hollow dengan Cat Minyak Merk Avian	
2.	Logistik/Administrasi	org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	org		
5.	Tukang	2 org		
6.	Pekerja	2 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Ember	4 bh		
2.	Kuas Cat	2 bh		
3.	Mesin Bor	1 unit		
4.	Mesin Gerinda	3 unit		
5.	Mesin Las	2 unit		
6.	Meteran	3 bh		
7.	Palu	3 bh		
8.	Roller Cat	2 bh		
9.	Tang	1 bh		
10.	Waterpass	1 bh		
<u>Diperiksa oleh :</u> Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan <u>Dibuat oleh :</u> Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			MINGGU KE : IV (EMPAT)	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			HARI : RABU	
TAHUN ANGGARAN : 2025			TANGGAL : 16 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Pek. Rangka Atap Hollow Galvanish 4x4 & 4x6 cm tebal 1,0 mm 2. Pek. Penutup Atap Galvalum Metal Tebal 0.30 mm 3. Pek. Pengecatan Hollow dengan Cat Minyak Merk Avian	
2.	Logistik/Administrasi	1 org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	org		
5.	Tukang	2 org		
6.	Pekerja	2 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Ember	4 bh		
2.	Kuas Cat	2 bh		
3.	Mesin Bor	2 unit		
4.	Mesin Gerinda	2 unit		
5.	Mesin Las	2 unit		
6.	Meteran	3 bh		
7.	Palu	3 bh		
8.	Roller Cat	2 bh		
9.	Tang	1 bh		
10.	Waterpass	1 bh		
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA			Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA	
				
M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan			SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur	

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			MINGGU KE : IV (EMPAT)	
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			HARI : KAMIS	
TAHUN ANGGARAN : 2025			TANGGAL : 17 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Pek. Penutup Atap Galvalum Metal Tebal 0.30 mm 2. Pek. Pengecatan Hollow dengan Cat Minyak Merk Avian 3. Pek. Lsplank GRC	
2.	Logistik/Administrasi	org		
3.	Mandor	org		
4.	Kepala Tukang	org		
5.	Tukang	2 org		
6.	Pekerja	2 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Ember	4 bh		
2.	Kuas Cat	2 bh		
3.	Mesin Bor	2 unit		
4.	Mesin Gerinda	2 unit		
5.	Mesin Las	1 unit		
6.	Meteran	3 bh		
7.	Palu	3 bh		
8.	Roller Cat	2 bh		
9.	Tang	1 bh		
10.	Waterpass	1 bh		
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL LOKASI : KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN : 2025			LAPORAN HARIAN MINGGU KE : IV (EMPAT) HARI : SABTU TANGGAL : 19 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Pek. Penutup Atap Galvalum Metal Tebal 0.30 mm	
2.	Logistik/Administrasi	1 org	2. Pek. Lisplank GRC	
3.	Mandor	org	3. Pek. Instalasi Lampu	
4.	Kepala Tukang	org	4. Pek. Sakelar Tunggal	
5.	Tukang	4 org	5. Pek. Sakelar Ganda	
6.	Pekerja	2 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Ember	6 bh		
2.	Mesin Bor	3 unit		
3.	Meteran	2 bh		
4.	Obeng	2 bh		
5.	Palu	4 bh		
6.	Tang	4 bh		
7.	Tespen	2 bh		
8.	Waterpass	1 bh		
<u>Diperiksa oleh :</u> Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan <u>Dibuat oleh :</u> Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			LAPORAN HARIAN	
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA				
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL				
LOKASI : KOTA PEKALONGAN			MINGGU KE : IV (EMPAT)	
TAHUN ANGGARAN : 2025			HARI : MINGGU	
			TANGGAL : 20 April 2025	
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BERKAH ABISATYA				
NO.	TENAGA KERJA	JML	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	
1.	Pelaksana	1 org	1. Pek. Pembersihan Lokasi	
2.	Logistik/Administrasi	1 org	2. Pek. pengecatan Kolom dan Balok No Drop	
3.	Mandor	org	3. Pek. Pemasangan Lampu LED 18 watt	
4.	Kepala Tukang	1 org		
5.	Tukang	1 org		
6.	Pekerja	1 org		
			CUACA : CERAH/GERIMIS/HUJAN	
			MULAI JAM KERJA : 08.00 s/d 16.30 WIB	
NO.	ALAT-ALAT YANG DIPAKAI	JML	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	JML
1.	Ember	3 bh		
2.	Kape	2 bh		
3.	Kuas Cat	3 bh		
4.	Roller Cat	2 bh		
Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas CV. BINA REKATAMA  M. BAGUS SAMPURNO Pengawas Lapangan Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. BERKAH ABISATYA  SENO ADI DOYO, S.Kom. Direktur				



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seruni No 66 Telp. (0285) 421600 - 51122 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Suroboyo No. 68 Telp. : (0355) 4219001 - 31120 - Pekalongan

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

ML ROFIKW, S.M.

NIF: 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

OK

NIMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA



M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :


KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR
------------	---------------



DENAH KOTA PEKALONGAN
Skala : NIS

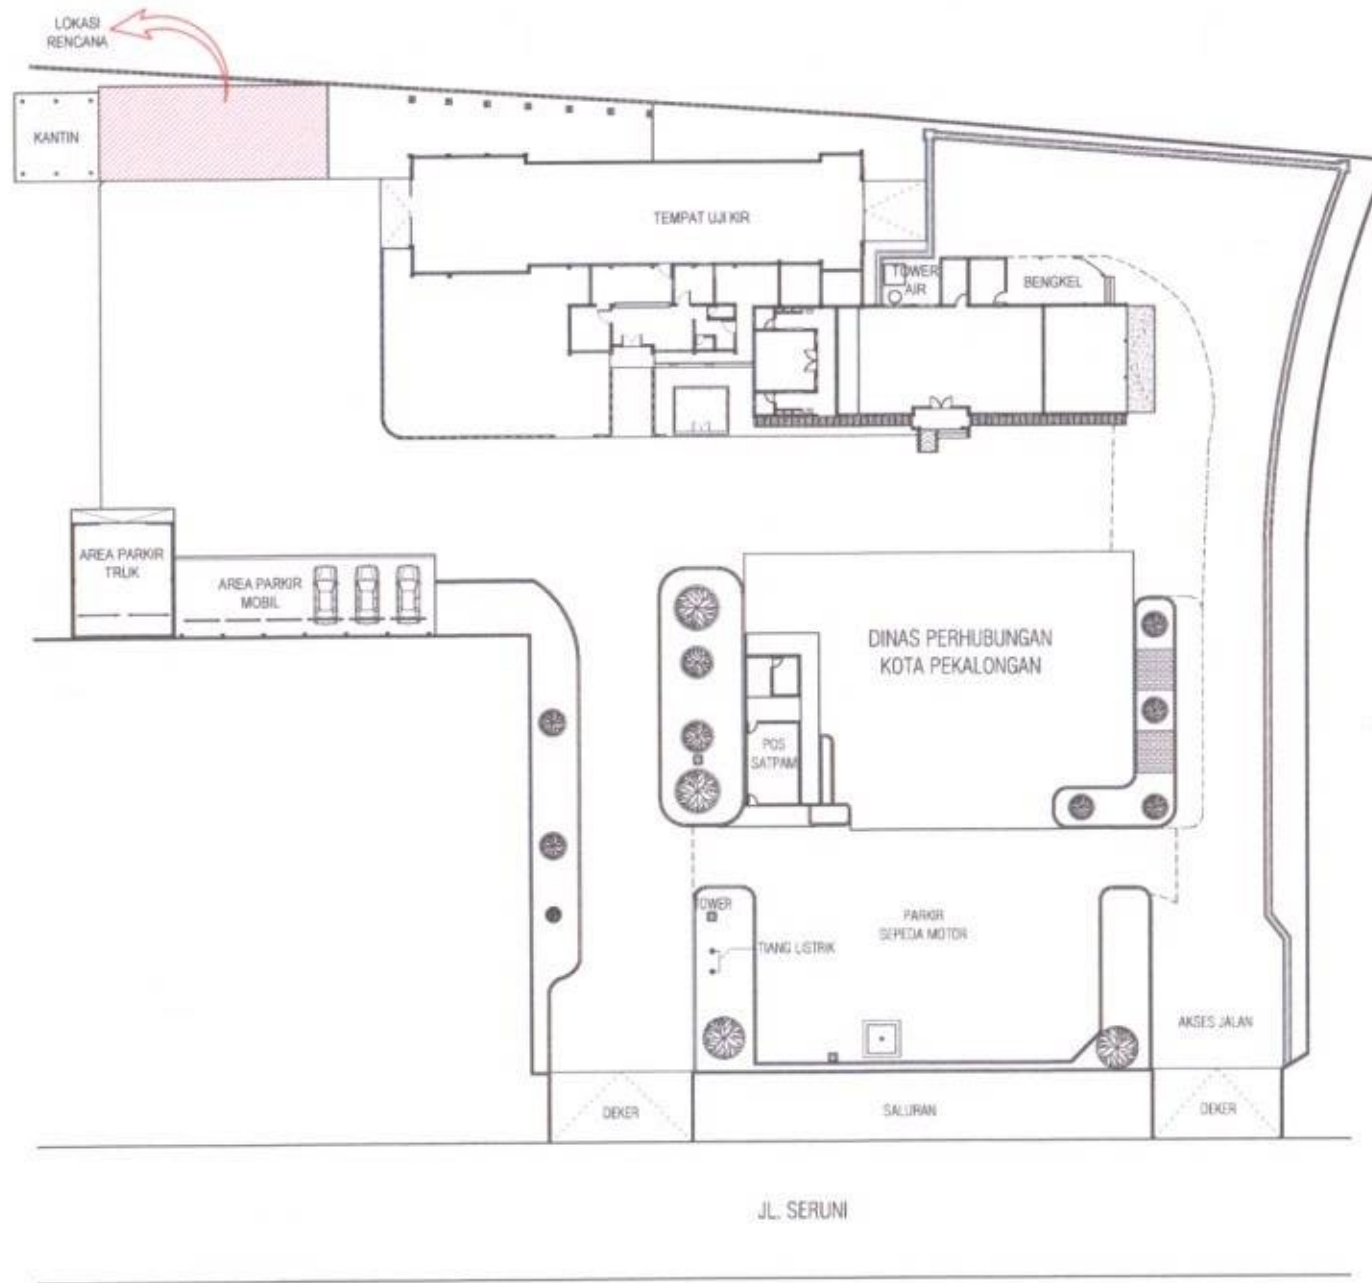

LAYOUT PLAN
skala 1 : 400



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seruni No. 88 Telp. (0853) 421488 - 51122 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKom)

M. ROFIKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

NIRMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sururi No.18 Telp. (0285) 4216001 - 51122 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKom)

M. ROFKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

NIMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA


M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR

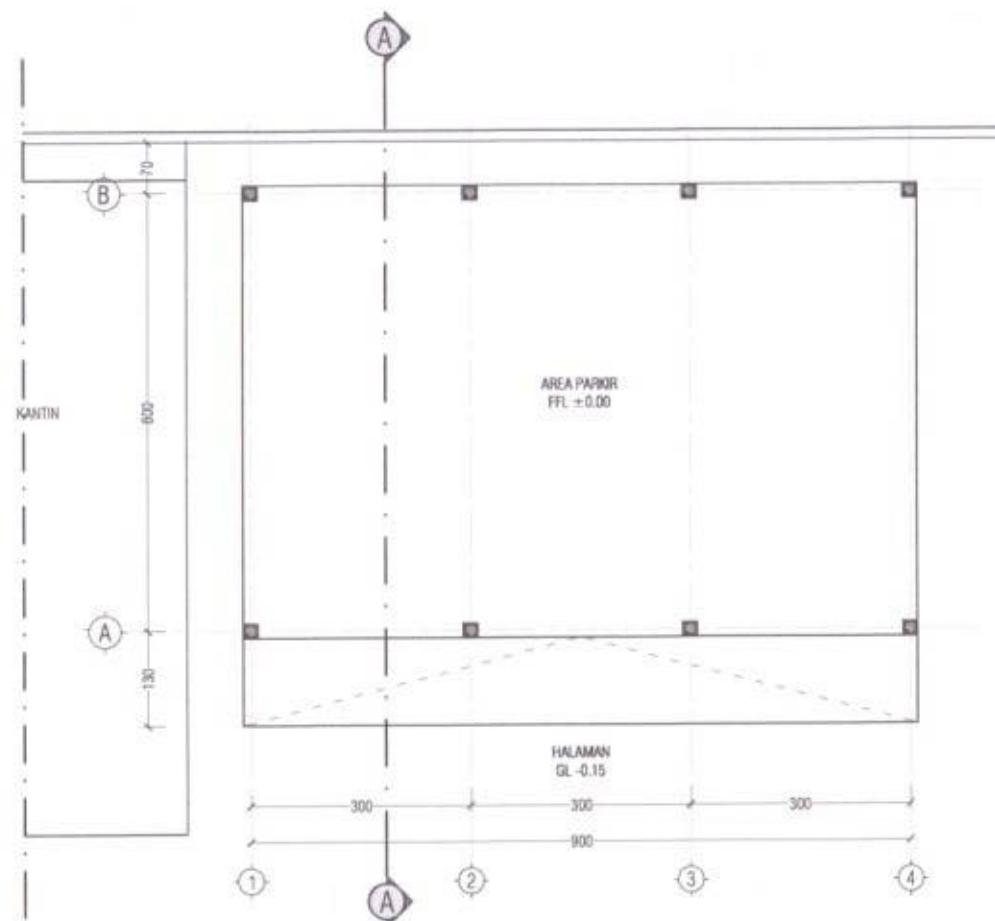

DENAH RENCANA
skala 1 : 75



3D PERSPEKTIF
skala 1:1



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Tanjung Mas 600 Telp. : (0305) 4210000 - 511122 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025


MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKom)

M. ROFIKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


NYMATUN NAZILAH, S.H.

NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA



M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA



SENG ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR



3D PERSPEKTIF
skala 1:100



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seroja No. 65 Telp. (0285) 421090 - 51102 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKom)

M. ROFKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

NYMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR



3D PERSPEKTIF
skala N.T.S.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Tawar Np. 68 - Telp. (0285) 4211000 - 51120 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI/
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKom)

M. ROFIQIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

NIRMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA

SENDI ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Suroyo No. 88 Telp. : (0285) 421800 - 511327 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKort)

M. ROFIKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

NIMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan


DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA


SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR


JUMLAH LEMBAR

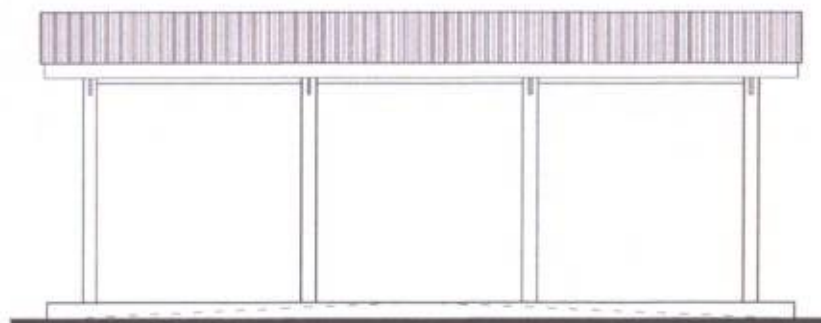


TAMPAK DEPAN

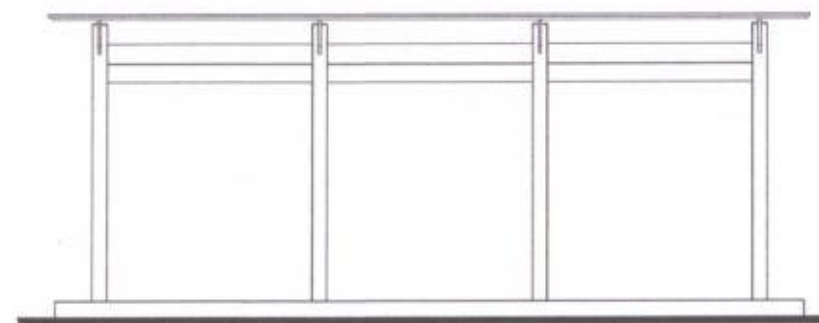

TAMPAK BELAKANG

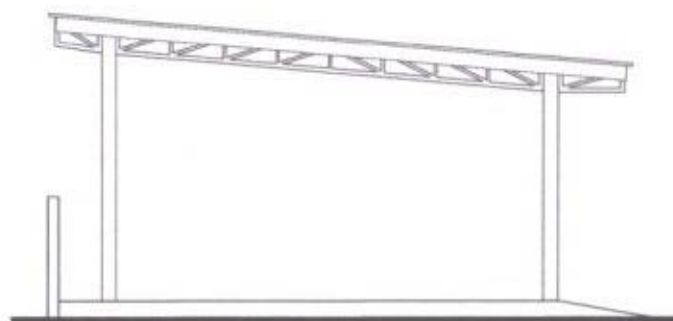

TAMPAK SAMPING KIRI

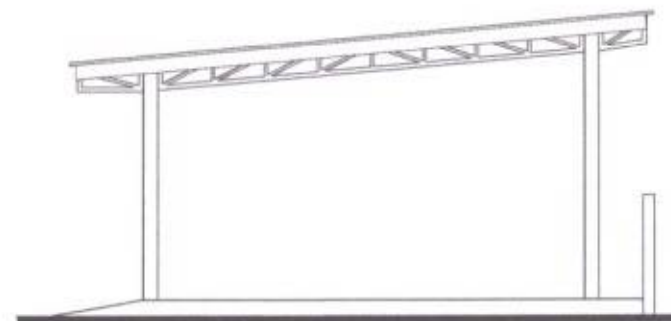

TAMPAK SAMPING KANAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sarun No. 56 Telp. : (085) 471906 - 51126 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKor)

M. ROFIKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


NPMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA



M. BAGUS SAMPURO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA


SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR

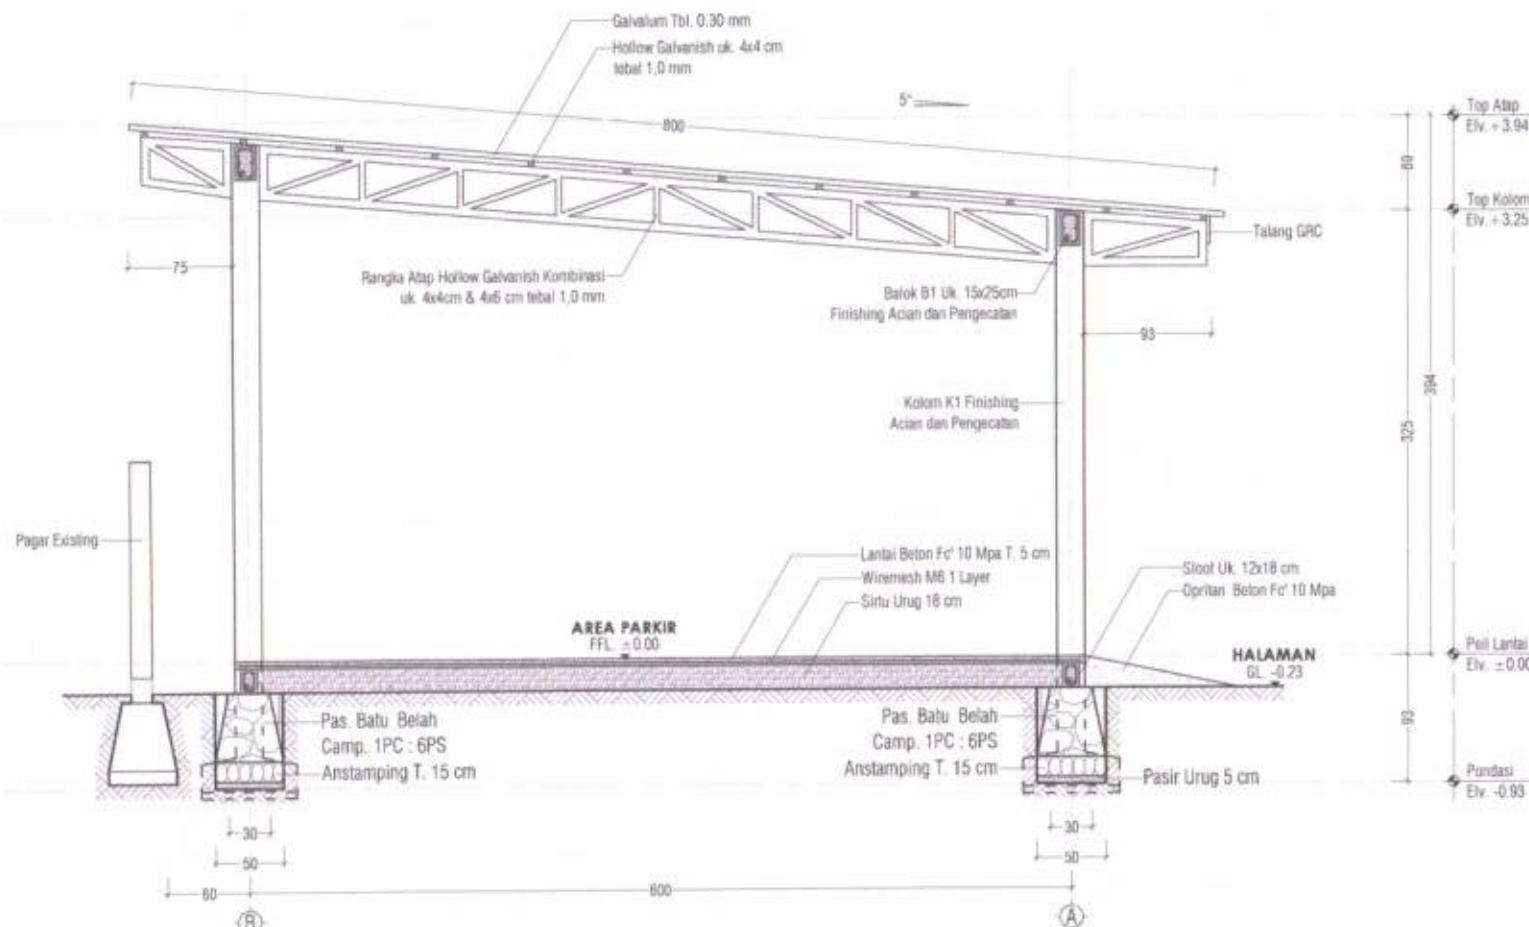



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seroja No. 88 Telp. : 0285 / 421600 - 51102 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKorn)

M. RORIKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

NIRMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA


M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :


KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR

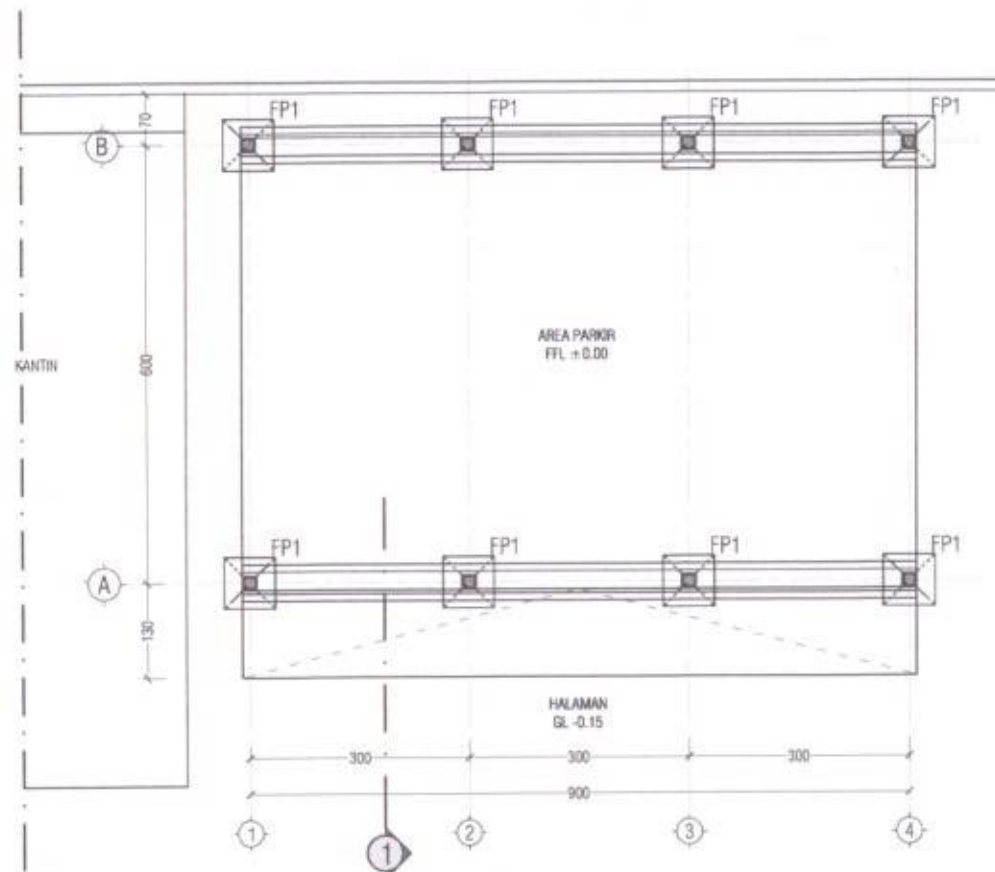

DENAH PONDASI
skala 1 : 75

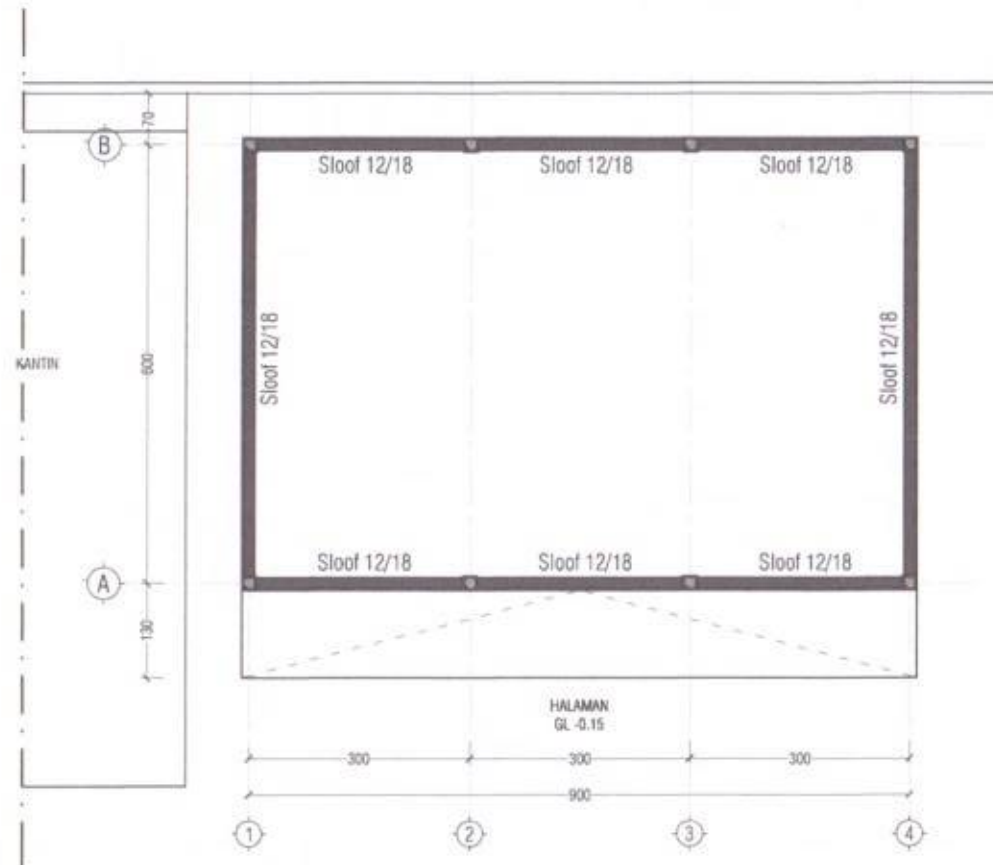

DENAH SLOOF
scale 1 : 75



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sarun Ni No. 1001 - 1005 - 10100 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKort)

M. ROFIKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

[Signature]

NIMATUN NAZLAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA

[Signature]

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan


DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA

[Signature]

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR : JUMLAH LEMBAR

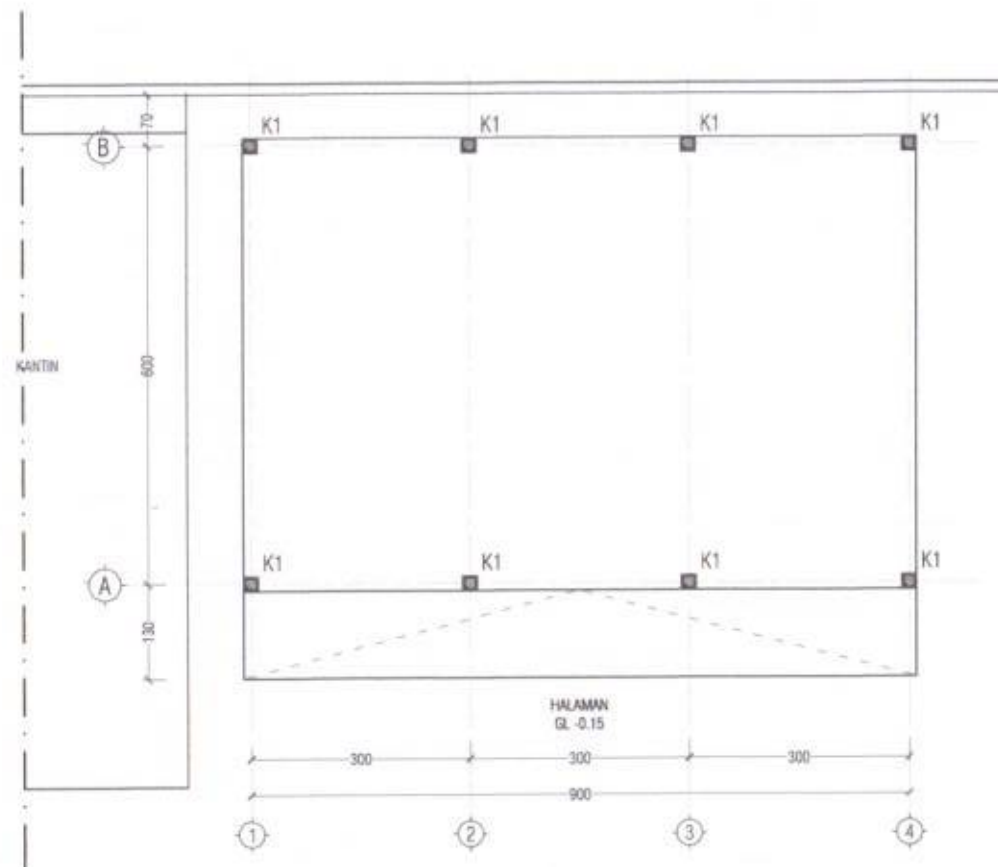

DENAH KOLOM
SKALA 1 : 75



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sarayu No. 66 Telp. (0285) 4214835 - 511322 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKom)

M. ROFKIN, S.M.

NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

[Signature]

NIMATUN NAZILAH, S.H.

NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA

[Signature]

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA

[Signature]

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sarung No 56 Telp: (0285) 421000 - 51122 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKom)

M. ROFKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

NIMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA


M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR

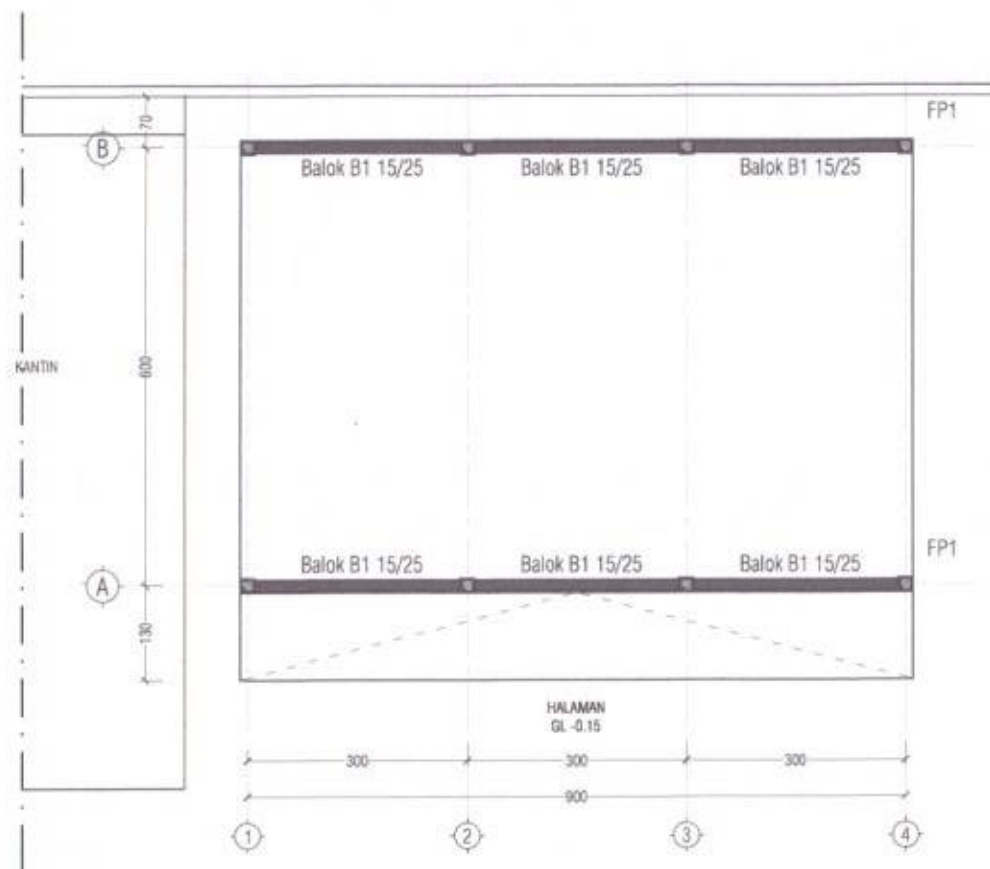

DENAH SLOOF
skala 1 : 75



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seroja No. 66, Telp. : (0285) 4216000 - 4216222 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKorn)

M. ROFKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

NIRMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA


M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR

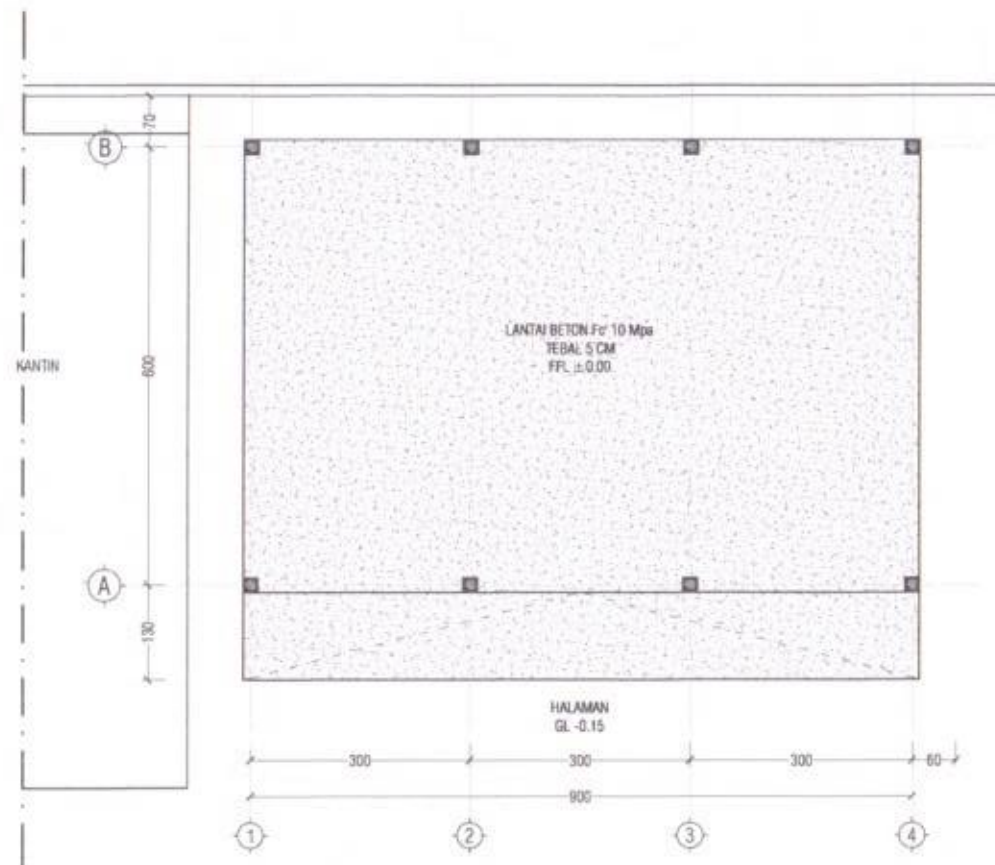

 **DENAH LANTAI BETON**
skala 1 : 75



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Surapati No. 86 Telp. (0285) 421020 - 51122 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKam)

M. ROFKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

NIRMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA


M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur


NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR

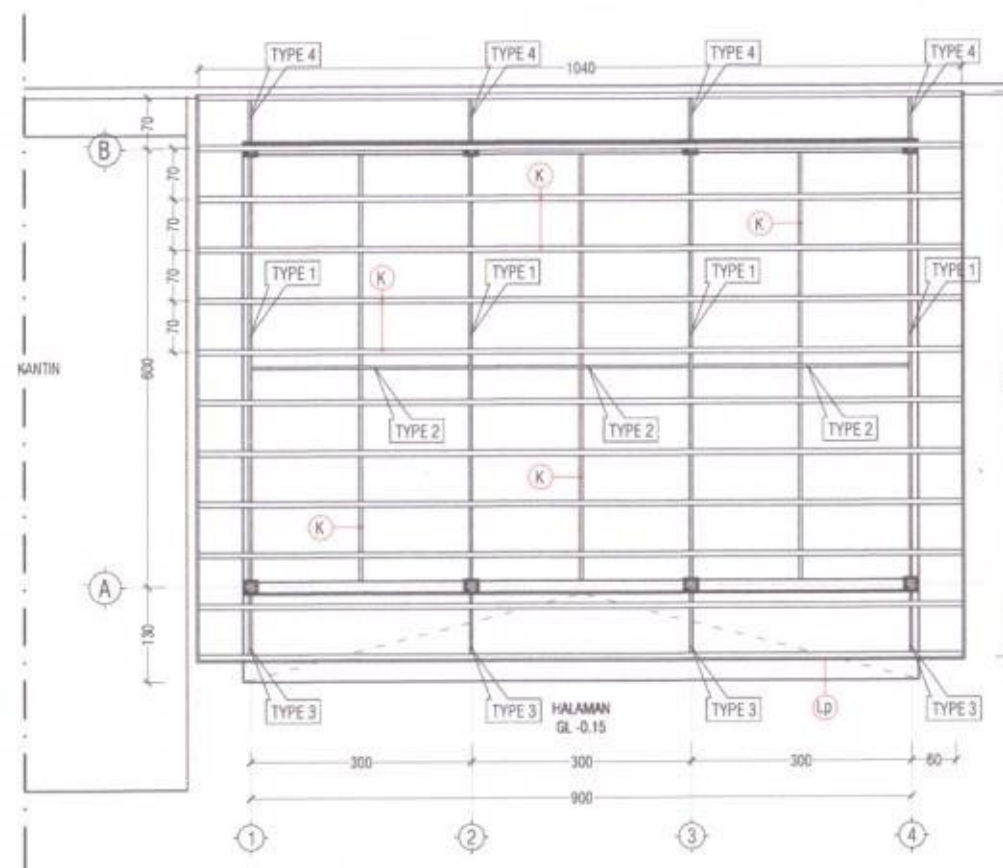


DENAH RANGKA ATAP
SKALA 1 : 75

Keterangan :

K	Kaso Hollow Galvanish uk. 4x4 cm tbi 1,0 mm
Ls	Lisplank GRC

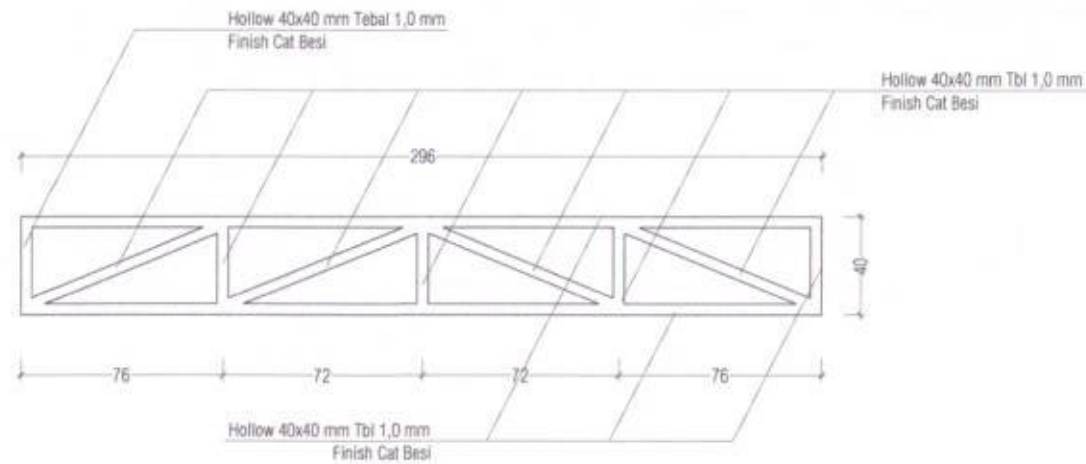


TYPE 2

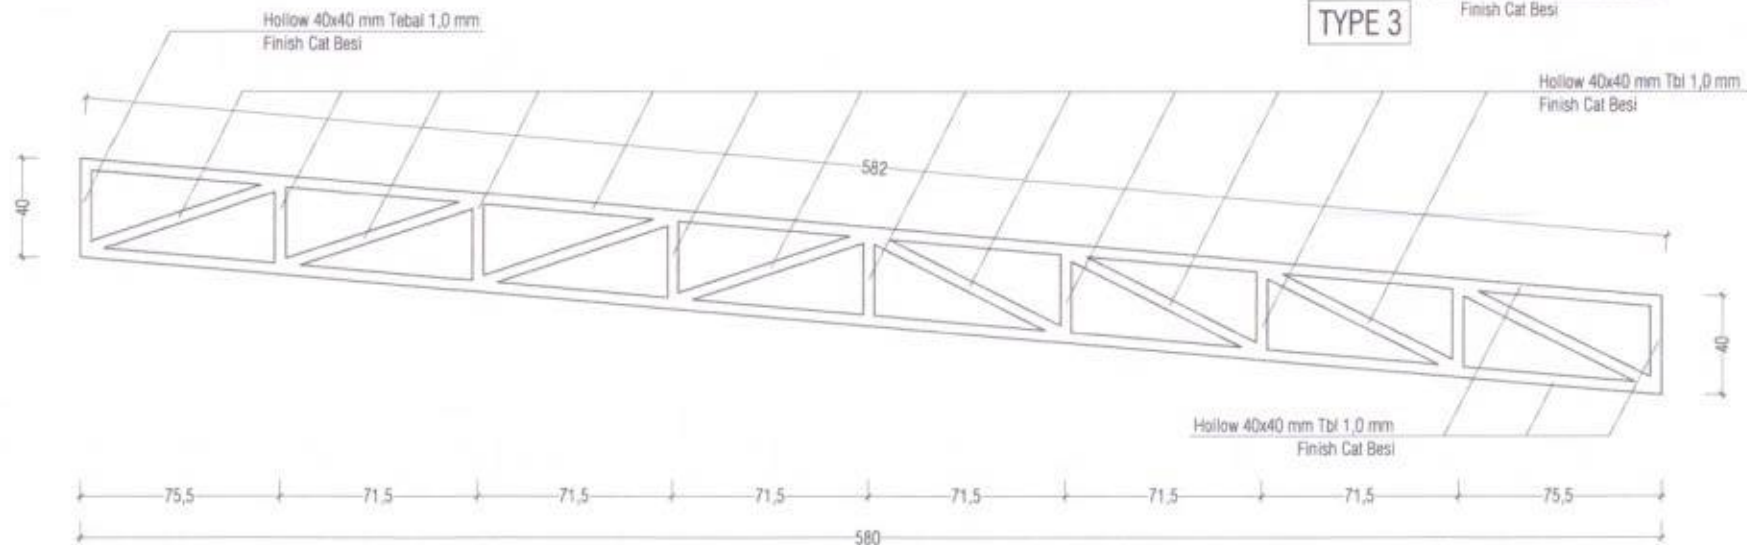

TYPE 1

 **DETAIL RANGKA ATAP**
skala 1 : 20

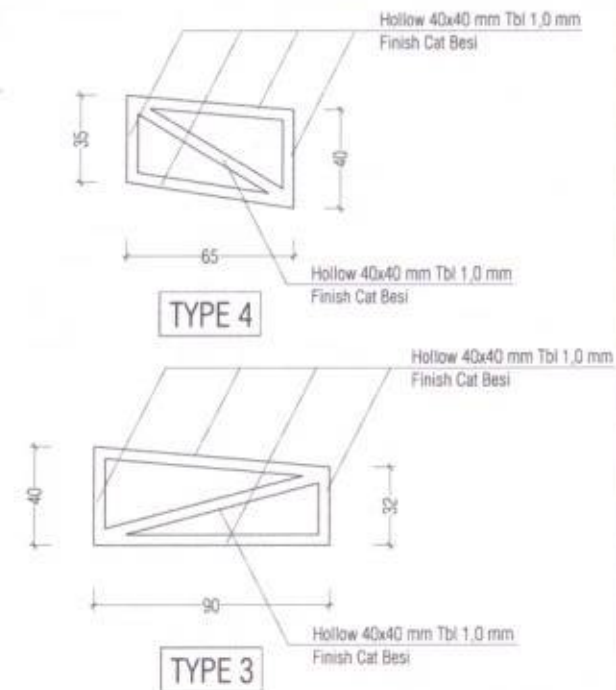

TYPE 4

TYPE 3



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sempur No. 61 Telp. (0285) 421020 - 51123 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKom)

M. ROFIKIN, S.M.
NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)



NIMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :


KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA



M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan


DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA



SENO ADI DOYO, S.Kom
Direktur

NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR



KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PRK/om)

M. ROSEMAN, S.M.
NIP 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


NIMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA


M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA

SENJO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR

JUMLAH LEMBAR



Technical drawing of a square pile cap and its cross-section.

Plan View (Left):

- Overall dimensions: 70 cm x 70 cm.
- Central pile dimensions: 20 cm x 20 cm.
- Reinforcement: Ø12 - 150.
- Wiremesh M6 1 Layer.

Cross-Section View (Right):

- Overall dimensions: 70 cm x 70 cm.
- Central pile dimensions: 27.5 cm x 27.5 cm.
- Reinforcement: Ø12 - 150.
- Concrete strength: F'c = 20 Mpa.
- Wiremesh M6 1 Layer.

DETAIL PONDASI FOOTPLAT (FP 1)
skala 1 : 20



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seroja No 60 Telp. : (085) 4218000 - 521327 - Pekalongan

SHOP DRAWING

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GARASI
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

MENGETAHUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPKopt)

M. ROFIQUL S.M.

NIP. 19731015 199501 1 001

MENYETUJUI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

NIRMATUN NAZILAH, S.H.
NIP. 19701119 199003 2 002

DIPERIKSA OLEH :

KONSULTAN PENGAWAS
BINA REKATAMA

M. BAGUS SAMPURNO
Pengawas Lapangan

DIBUAT OLEH :

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. BERKAH ABISATYA

SENO ADI DOYO, S.Kom.
Direktur

NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR

DIMENSI BALOK	12 x 18 CM	DIMENSI BALOK	20 x 20 CM	DIMENSI BALOK	15 x 25 CM
SLOOF (SL)		KOLOM (K1)		BALOK (B1)	
TULANGAN POKOK	4 Ø12	TULANGAN POKOK	4 Ø12	TULANGAN POKOK	6 Ø12
SENGKANG	Ø8 - 150	SENGKANG	Ø8 - 150	SENGKANG	Ø8 - 150
SELIMUT BETON	20 MM	SELIMUT BETON	20 MM	SELIMUT BETON	20 MM
MUTU BETON	f _c = 20 Mpa	MUTU BETON	f _c = 20 Mpa	MUTU BETON	f _c = 20 Mpa

DETAIL PEMBESIAN
skala 1 : 10
